

03 Tabulka místností 3.NP - osy C-E					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdi	Povrchová úprava stropu
3.03	Chodba	131,61	PVC	Omítka + nátěr	Minerální kazetový podhled
3.23	Seminární místnost	42,98	PVC	Omítka + nátěr	Minerální kazetový podhled
3.24	Kancelář	27,22	Koberec	Omítka + nátěr	Minerální kazetový podhled


### Legenda:

#### Obecné bourací a demontážní práce:

- Odpojení energií a médií v pracovním prostoru.
- Vystěhování stávajícího mobiliáře daných prostor.
- Demontáž stávajících instalací, zařizovacích předmětů a koncových prvků.
- Demontáž kazetových podhledů.
- Stržení nášlapných vrstev.
- Oškrábání stávajících omítek.


#### Bourání a demontáže:

- 1 - Demontáž stávajícího okna včetně vnitřního a vnějšího parapetu.
- 2 - Vybourání stávajícího obvodového zdiva tl. cca 400 mm + KZS tl. cca 150 mm.

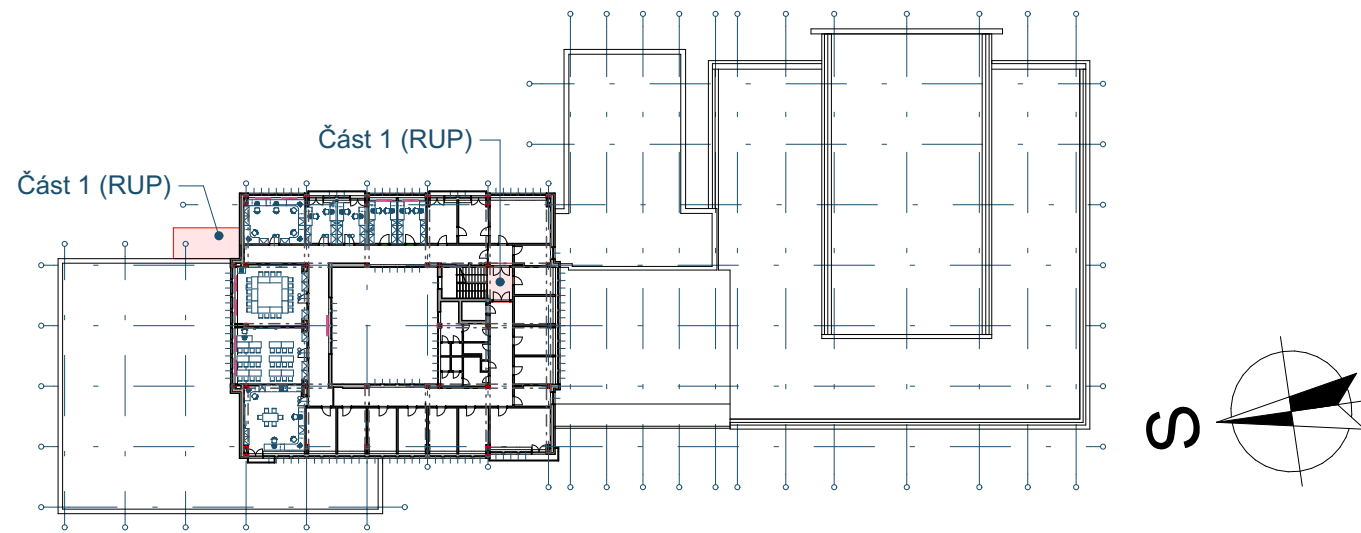

Revize	Popis revize	Datum	Podpis

±0,000 = 1.NP m n.m., Balt p.v.

Zodp. projektant:		Projektant:		Hlavní inženýr projektu:		Generální projektant:	
Ing. Jan Šubrt		Ing. Petr Ramík		Ing. Petr Ramík		 <b>RV projekt</b>	
Místo stavby:		17. listopadu 930/8, Olomouc, 779 00				RV projekt s.r.o.	
Katastr:		k.ú. Olomouc-město, č. parcely st.1501, 94/71, 94/74				Poláškova 1535, Val. Meziříčí, 757 01	
Stavebník:		Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00				info@rvprojekt.cz	
Název stavby:		<b>PF UPOL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 2</b>				www.rvprojekt.cz	
						+420 724 877 726	
						Projektant dílčí části:	
Objekt:		<b>D.1 - Budova B</b> <b>D.1.1 - Architektonicko stavební řešení</b>				Datum	
						02/2023	
						Stupeň	
						DPS	
						Formát	
						6xA4	
						Měřítko	
						1:750	
Název výkresu:		<b>3.NP - stávající stav a bourání - osy C-D_5-6 (část 1)</b>				Číslo výkresu	
						<b>2022_45.2-D.1.1_23</b>	
