

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 186/OVZ/PV/2022

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 61989592

DIČ: CZ61989592

osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace Smlouvy:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických (technický dozor stavebníka):

(dále jen „Objednatel“)

a

E.PROXIMA, s.r.o.

se sídlem: Holická 1099/31, 772 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18014

IČO: 25395602

DIČ: CZ25395602

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Jan Bukovjan, jednatel

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 186/OVZ/PV/2022 ze dne 22. 11. 2022:

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 22. 11. 2022 Smlouvu o dílo č. 186/OVZ/PV/2022 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal za podmínek dále uvedených v této Smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo, jehož rozsah a obsah a parametry je smluvními stranami dohodnut a popsán v této Smlouvě, a Objednatel se zavázal Dílo převzít, poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu za Dílo. Dílem dle Smlouvy se rozumí zhotovení stavby „Víceúčelový objekt pro výuku a osvětovou činnost PřF UPOL“ v souladu s Technickými podmínkami, Společným povolením č.j. S-SMOL/094674/2021/OS ze dne 20.08.2021, dokumentací pro provádění stavby, vše jako součást této Smlouvy v příloze č. 1, včetně výkonu inženýrské činnosti, a to v rozsahu dle Smlouvy.

2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn: TLZ 07 – Změny elektroinstalace, TLZ 08 – Přípojka optokabelu, TLZ 09 – Odstranění pařezů, TLZ 10 – Vodoměrná šachta, TLZ 11 - VO+ přívod NN ke stávající budově, TLZ 12 - Úprava uličního oplocení a u vitrín, TLZ 13 - Branka k venkovnímu schodišti, TLZ 14 – Kazetový podhled a TLZ 15 – Neprováděné práce, které jsou všechny součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

1. V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se **zvýšuje o částku 505.865,57 Kč bez DPH a snižuje o částku 327.677,05 Kč bez DPH**, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy takto:

7.1. Cena za Dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí celkem **26.398.220,03 Kč** (slovy dvacet šest milionů tři sta devadesát osm tisíc dvě stě dvacet korun českých a tři haléře).

IV.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. Tento dodatek se pořizuje v elektronické podobě.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, včetně rekapitulace k tomuto dodatku“, projektová dokumentace k TLZ 7 samostatně v el. podobě na CD

V Olomouci dne 26.10.2023
Za Objednatele:

V Olomouci dne 26.10.2023
Za Zhotovitele:

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci




Jan Bukovjan
jednatel společnosti E.PROXIMA, s.r.o.

Technický list změny (TLZ 7)

TLZ č./verze:	7/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 5. 10. 2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	186/OVZ/PV/2022
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.
Objekt:	
Název změny:	Změny elektroinstalace
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Změna elektroinstalace v objektu byly vyvolány: Dle požadavků Objednatele a ČEZ Distribuce a.s. je nutné upravit rozvaděč RE v plotovém poli tak, že dojde ke sloučení jednotného měření pro celý areál. Dále touto změnou bylo nutné upravit i rozvaděč RH v části FVE, řešení navrhl Generální projektant ve spolupráci se subdodavatelem FVE a ELE tak, aby byly splněny veškeré technické podmínky pro funkčnost daných systémů. Dopad do ceny vyvolaný odpočty a přípočty prací a zařízení koncových prvků slaboproudu v souladu s požadavky Objednatele. Změny zařízení a doplnění zařízení byly nutné v kompatibilitě a funkčnosti daných prvků s ostatními zařízeními již instalovanými v areálech PŘF UPOL, což PD nezohledňovala. Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).	
Popis změny:	
Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla vícepráce ve výši 131.676 Kč a méněpráce ve výši - 50.932,10 Kč. Celkový rozdíl mezi pracemi požadovanými nad rámec PD a pracemi neprovedenými činí 80.743,90 Kč. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržáním původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.	
Přílohy:	

Příloha č. 1 – Změnový list č. 7 – rozpočet změny elektroinstalace

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-50 932,10 Kč
	Přípočet:	131 676,00 Kč
	Celkem:	80 743,90 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	 Univerzita Palackého v Olomouci – PŘF	12.10. 2023		
Za TDI:				
Za projektanta:	 Atelier Polách & Bravenec s.r.o.			
Za zhotovitele:	 E.PROXIMA, s.r.o.			

ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PřF UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.7 - elektroinstalace - změny rozvaděč RE, RH, topné kabely..

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Položka	Materiál					3 173,00	0,000
1	1	Rozvaděč RE stáv	ks	-1,000	7 277,00	-7 277,00	0,000
2	2	Rozvaděč RE nový atyp nerez	ks	1,000	10 450,00	10 450,00	0,000

3	Doplnění rozvaděče RH z 5 2023					7 460,00	0,000
3	4	Vypínací cívka na napětí	ks	1,000	650,00	650,00	0,000
4	5	montáž vypínací cívky	ks	1,000	350,00	350,00	0,000
5	6	montáž ET 340 FVE	ks	1,000	500,00	500,00	0,000
6	7	Jistič PL7/C2/1	ks	1,000	303,00	303,00	0,000
7	8	Jistič PL7/C25/1	ks	1,000	202,00	202,00	0,000
8	9	Montáž jističe	ks	2,000	105,00	210,00	0,000
9	10	PL7/25/3/B	ks	1,000	742,00	742,00	0,000
10	11	Montáž jistie 3 f	ks	1,000	120,00	120,00	0,000
11	12	Vypínací modul IS-32/3	ks	1,000	433,00	433,00	0,000
12	13	montáž modulu	ks	1,000	120,00	120,00	0,000
13	14	stykač jednofázový	ks	1,000	450,00	450,00	0,000
14	15	mont. Stykače	ks	1,000	150,00	150,00	0,000
15	16	stykač třífázový 40 nA	ks	1,000	690,00	690,00	0,000
16	17	montáž stykače 3.f	ks	1,000	250,00	250,00	0,000
17	18	BackUP SPMP 4P 40A mont	ks	1,000	250,00	250,00	0,000
18	19	izol. podpěry pro svorkovnici N	ks	6,000	165,00	990,00	0,000
19	20	mont.podběr a svor. N	ks	3,000	150,00	450,00	0,000
20	21	podružný materiál	ks	1,000	600,00	600,00	0,000

23	Stavební objekt					70 110,90	0,000
21	24	Topný kabel	m	2,000	360,00	720,00	0,000
22	25	přípoj a ukon. díly bal.	m	2,000	310,00	620,00	0,000
23	26	montáž kabelu	m	2,000	550,00	1 100,00	0,000
24	27	LD Systems SAT 262 G2 W repro	ks	-2,000	6 400,00	-12 800,00	0,000
25	28	the t.amp E-400 zesilovač	ks	-1,000	3 800,10	-3 800,10	0,000
26	29	Optická vana pro SC/LC, s výsuvným šuplíkem, vybavená	ks	1,000	1 031,00	1 031,00	0,000
27	30	Crown XLi 800 zesilovač	ks	1,000	7 512,00	7 512,00	0,000
28	31	JBL Control 28-1 WH repro	ks	2,000	8 077,00	16 154,00	0,000
29	32	Tlačítkový ovladač LOXONE Touch Pure Tree	ks	-3,000	3 900,00	-11 700,00	0,000
30	33	Touch Pure Flex Tree bílá	ks	3,000	5 700,00	17 100,00	0,000
31	34	Intercom bílá včetně klívesnice a rámečku	ks	1,000	23 252,00	23 252,00	0,000
32	35	Nastavení loxone - vcp	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	0,000
33	42	Modbus extension Loxone	ks	4,000	6 900,00	27 600,00	0,000
34	43	Zapojení a nastavení modubus extenssion	ks	4,000	800,00	3 200,00	0,000
35	44	4K PoE NVR 16 IP kamer, 16x POE 200W, max. obousměrný datový tok 160Mbps, podpora kamer až 8MP, komprese obrazu H.265+/H.265 / H.264+/H.264 / G.711, synchronní přehrávání, videoanalýza obrazu, podpora 2x HDD 10TB (SATA 3.5"), 3x USB, 1x audio výstup, 4x/1	ks	-1,000	15 355,00	-15 355,00	0,000
36	45	Switch HP Aruba 16port Poe	ks	1,000	6 977,00	6 977,00	0,000

Celkem


80 743,90

0,000

Technický list změny (TLZ 8)

TLZ č./verze:	8/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 5. 10. 2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	186/OVZ/PV/2022
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.
Objekt:	
Název změny:	Přípojka optokabelu
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Vícepráce byly provedeny na základě požadavku zástupce CVT UPOL, který ustanovil nové místo napojení přípojky optokabelu oproti místu připojení dle PD. Změna místa napojení byla vyvolána prostým faktem, že v místě napojení bylo nutné rozdělit optický kabel tak, aby byla vytvořena rezerva a splnily se podmínky pro napojení na optickou trasu, které nebyly v rámci PD řešeny. Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).	
Popis změny:	
Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla vícepráce ve výši 26.443 Kč. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržením původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.	
Přílohy:	
Příloha č. 1 – Změnový list č. 8 – přípojka optokabelu	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	26 443,00 Kč
	Celkem:	26 443,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	 Univerzita Palackého v Olomouci – PŘF	12. 10. 2018		
Za TDI:				
Za projektanta:	 Atelier Polách & Bravenec s.r.o.			
Za zhotovitele:	 E.PROXIMA, s.r.o.			

ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PřF UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.8 - přípojka optokabelu

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 5. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

742 Elektroinstalace 14 513,00 0,000

1	01	Komora zemní pro data 670x490x330	kus	1,000	2 144,00	2 144,00	0,000
2	02	Optická zemní spojka	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	0,000
3	03	Gas-bl 10 mm	kus	3,000	114,00	342,00	0,000
4	04	HDPE 32	m	30,000	28,50	855,00	0,000
5	05	Mikrotubička 10/8	m	30,000	5,70	171,00	0,000
6	06	Spojka redukční 12/10	kus	2,000	85,50	171,00	0,000
7	07	Manipulace s kabelem	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	0,000
8	08	Manipulace se spojkou	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	0,000
9	09	Svár opt.vláknů vč. měření	kus	18,000	285,00	5 130,00	0,000

1 Zemní práce 11 930,00 0,000



10	280100100	Vytvoření prostupů v základech oplocení	hod	5,000	350,00	1 750,00	0,000
11	113106021	Rozebrání dlažeb chodníku	m2	2,500	300,00	750,00	0,000
12	006	Ruční výkop pro propojení + zpětný zához	hod	9,000	350,00	3 150,00	0,000
13	596811120	Kladení dlažby - zpětné zadláždění chodníku	m2	2,500	550,00	1 375,00	0,000
14	007	D+M chrániček pod vjezdem pro čidla a motory brány Kopoflex 50	mb	15,000	175,00	2 625,00	0,000
15	008	Výkop rýhy + zpětný zásyp	m3	2,400	950,00	2 280,00	0,000

Celkem 26 443,00 0,000

Technický list změny (TLZ 9)

TLZ č./verze:	9/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 5. 10. 2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	186/OVZ/PV/2022
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.
Objekt:	
Název změny:	Odstranění pařezů
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Při provádění prací u stavebního objektu 06 - vsakovací objekt a akumulární nádrž bylo zjištěno, že v prostoru výkopu plánovaných zařízení se pod povrchem nachází rozsáhlý kořenový systém již v minulosti pokácených stromů, který bylo nutné pro pokračování zemních prací odstranit. Vzhledem k tomu, že v místě stavby výše uvedených zařízení nebyl proveden geologický průzkum a tudíž nebylo možno tyto práce předpokládat v rámci stanovení ceny Stavby. Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).	
Popis změny:	
Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla vícepráce ve výši 43.990 Kč. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržáním původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.	
Přílohy:	
Příloha č. 1 – Změnový list č. 9 – rozpočet odstranění pařezů	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	43 990,00 Kč
	Celkem:	43 990,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	 Univerzita Palackého v Olomouci – PŘF	12.10. 2023		
Za TDI:				
Za projektanta:	 Atelier Polách & Bravenec s.r.o.			
Za zhotovitele:	 E.PROXIMA, s.r.o.			

ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PřF UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.9 - odstranění pařezů

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 5. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	43 990,00	0,000
------------	----------------------------	------------------	--------------

18	Zemní práce - úpravy terénu	43 990,00	0,000
-----------	------------------------------------	------------------	--------------



1	01	řezání, sekání kořenů	hod	48,000	360,00	17 280,00	0,000
2	01.2	výkop, odkop - pásový bagr	hod	9,000	700,00	6 300,00	0,000
3	02.1	traktorbagr	hod	3,000	850,00	2 550,00	0,000
4	02.2	jeřáb	hod	2,000	900,00	1 800,00	0,000
5	02.3	nájezd jeřábu	km	40,000	40,00	1 600,00	0,000
6	02.4	doprava	hod	2,000	700,00	1 400,00	0,000
7	03	uložení	t	5,780	2 000,00	11 560,00	0,000
8	04	ostatní práce-rozebrání plotu, podhrabové desky ..	m	10,000	150,00	1 500,00	0,000

Celkem	43 990,00	0,000
---------------	------------------	--------------

Technický list změny (TLZ 10)

TLZ č./verze:	10/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 5. 10. 2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	186/OVZ/PV/2022
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.
Objekt:	
Název změny:	Vodoměrná šachta
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Změna ceny stavebního objektu 05 – vodovodní přípojka byla vyvolána skutečností, že vstupy vodoměrné šachty Modulo 1 navržené v PD neodpovídají navržené dimenzi vodovodního potrubí přípojky vody ke Stavbě. Bylo nezbytné místo šachty Modulo 1 osadit šachtu Composit s odpovídajícím vystrojeným zařízením a kompatibilitou s dimenzí potrubí vodovodní přípojky. Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).	
Popis změny:	
Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla vícepráce ve výši 26.668 Kč a méněpráce ve výši - 13.500 Kč. Celkový rozdíl mezi pracemi požadovanými nad rámec PD a pracemi neprovedenými činí 13.168 Kč. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržáním původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.	
Přílohy:	
Příloha č. 1 – Změnový list č. 10 – vodoměrná šachta	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 13 500,00 Kč
	Přípočet:	26 668,00 Kč
	Celkem:	13 168,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	 Univerzita Palackého v Olomouci – PŘF	12.10. 2015		
Za TDI:				
Za projektanta:	 Atelier Polách & Bravenec s.r.o.			
Za zhotovitele:	 E.PROXIMA, s.r.o.			

ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PřF UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.10 - vodoměrná šachta

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 5. 10. 2023

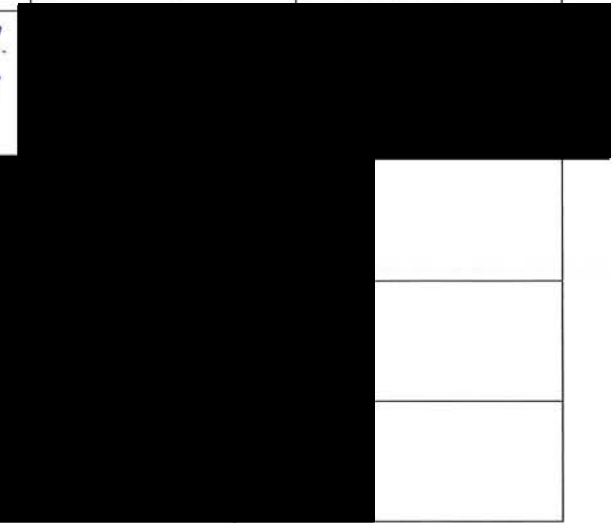
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				13 168,00	0,000
722		Zdravotechnika - vnější vodovod				13 168,00	0,000
1	722-01	vodoměrná šachta modulo 1 včetně vstrojení	kus	-1,000	13 500,00	-13 500,00	0,000
2	722-02	vodoměrná šachta Compozit včetně vstrojení	kus	1,000	26 668,00	26 668,00	0,000
		Celkem				13 168,00	0,000

Technický list změny (TLZ 11)

TLZ č./verze:	11/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 5. 10. 2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	186/OVZ/PV/2022
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.
Objekt:	
Název změny:	VO + přívod NN ke stávající budově
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Vícepráce vyvolané nutností provést přeložku kabelu NN vedoucí z HDS ke stávajícímu objektu v areálu Botanické zahrady PŘF UPOL, který se v prostoru Stavby neměl nacházet. Dále tento změnový list obsahuje náklady spojené s přeložením veřejného osvětlení (VO), neboť při zahájení prací na přeložení byl ze strany Technických služeb města Olomouce, a.s. (TSMO) vznesen požadavek, aby stávající hliníkový kabel mezi jednotlivými svítidly VO, vedený v areálu Botanické zahrady PŘF UPOL, byl nahrazen měděným kabelem včetně nového zemního pásu s tím, že TSMO dodá stožáry a svítidla VO, které budou i nadále v jejich správě. Tato práce byly provedeny, abychom v budoucnu eliminovali další rekonstrukce a zásahy na VO, které by poté narušili provoz objektů v areálu Botanické zahrady PŘF UPOL. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).	
Popis změny:	
Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla vícepráce ve výši 22 485,25 Kč Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržáním původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.	
Přílohy:	

Příloha č. 1 – Změnový list č. 11 – VO + přívod NN ke stávající budově

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	22 485,25 Kč
	Celkem:	22 485,25 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	 Univerzita Palackého v Olomouci – PŘF	12.10. 2023		
Za TDI:				
Za projektanta:	 Atelier Polách & Bravenec s.r.o.			
Za zhotovitele:	 E.PROXIMA, s.r.o.			

ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PŘF UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.11 - VO + přívod NN ke stávající budově

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 5. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 22 438,25 0,000

11 Zemní práce pro nové stožáry 6 480,00 0,000

1	460050704	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4	kus	2,000	700,00	1 400,00	0,000
2	460070255	Základové patky pro osazení stožáru	kus	2,000	980,00	1 960,00	0,000
3	28611335	Trubka kanalizace plastová KGEM-250x1000 mm SN8 - D+M	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	0,000

111 Přeložení přívodu NN pro stávající objekt 4 434,00 0,000

4	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,200	980,00	3 136,00	0,000
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,200	25,00	80,00	0,000
6	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,000	145,00	290,00	0,000
7	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	1,000	220,00	220,00	0,000
8	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	2,000	354,00	708,00	0,000

741 Elektroinstalace - veřejné osvětlení 7 327,43 0,000

9	741375833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnosti	kus	2,000	386,97	773,94	0,000
10	741373002	Montáž svítidla výbojkové na výložník / stožár	kus	2,000	435,34	870,68	0,000
11	35416011150	drát D 10mm FeZn - pro 2 stožáry	kg	4,000	80,30	321,20	0,000
12	748719211	Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	kus	2,000	580,46	1 160,92	0,000
13	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	2,000	290,23	580,46	0,000
14	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu - pro 2 stožáry	m	6,000	29,02	174,12	0,000
15	741122611.12	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) ve sloupu pro 3 světla	m	20,000	30,96	619,20	0,000
16	34103000175.1	kabel CYKY-J 3x1,5 ve sloupu pro 3 světla	m	20,000	15,48	309,60	0,000
17		Příložkové oko 50	kš	3,000	96,05	288,15	0,000
18		Trubka monoflex 1432 ve stožárech	m	6,000	13,56	81,36	0,000
19		Montáž trubky monoflex ve stožárech	m	6,000	11,30	67,80	0,000
20	Pol4	dmtž stávajících stožárů	ks	2,000	1 040,00	2 080,00	0,000

venkovního osvětlení z důvodu zabezpečení

D2 osvětlení Zamenhofovy ul 4 196,82 0,000

21		Montážní práce	hod	6,000	386,46	2 318,76	0,000
22		Krabice Scabox 240x190x90	ks	2,000	256,51	513,02	0,000
23		kabelová vývodka M32	ks	4,000	36,16	144,64	0,000
24		svorkovnice Hlak 25-4/8	ks	2,000	327,70	655,40	0,000
25		podružný materiál	ks	1,000	565,00	565,00	0,000

Celkem 22 438,25 0,000

Technický list změny (TLZ 12)

TLZ č./verze:	12/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 5. 10. 2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	186/OVZ/PV/2022
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.
Objekt:	

Název změny:	úprava uličního oplocení a u vitrín
--------------	-------------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Vzhledem k tomu, že ve stavebním povolení na Stavbu nebyla zahrnuta rekonstrukce a úprava oplocení areálu Botanické zahrady PŘF UPOL, tak Objednatel po dohodě s Generálním projektantem přistoupil k nezbytné úpravě stávajícího oplocení a to ve dvou částech. První část úpravy se týká zásahu do oplocení, tak aby byly přístupné informační vitríny umístěné ve fasádě Stavby přímo z veřejné komunikace v délce cca pěti metrů. Druhá část úpravy stávajícího oplocení byla vyvolána požadavkem firmy ČEZ Distribuce, a.s., která požadovala umístění elektroměrového rozvaděče RH, tak aby byl přístupný přímo z veřejné komunikace, což PD nesplňovala. Po dohodě s Generálním projektantem byl elektroměrový rozvaděč umístěn do sloupu místo posledního pole stávajícího plotu v sousedství s bránou Výstaviště Flora Olomouc, a. s..

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla vícepráce ve výši 41 928,32 Kč.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržáním původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 12 – úprava uličního oplocení a u vitrín

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	41 928,32 Kč
	Celkem:	41 928,32 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Univerzita Palackého v Olomouci – PŘF	12.10. 2023		
Za TDI:				
Za projektanta:	Atelier Polách & Bravenec s.r.o.			
Za zhotovitele:	E.PROXIMA, s.r.o.			

ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PŘF UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.12 - úprava uličního oplocení a u vitrín

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 5. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Úprava oplocení u vitrín 27 352,89 0,694

2 Zakládání 4 069,20 0,001

1	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 včetně bednění	m3	0,252	7 100,00	1 789,20	0,000
2	212755212	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních včetně obalení trubek a lože	m	6,000	380,00	2 280,00	0,001

3 Svislé a kompletní konstrukce 15 009,00 0,692

3	348121211	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	bm	10,000	1 000,00	10 000,00	0,004
4	348273661	Ukončující hlavice 700x500 mm - D+M	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	0,066
5	348278005	Ploty z cihel a tvárnic nepálených vápenopískových zídky na maltu cementovou včetně spárování z cihel plných , tloušťka zdiva 300 mm	m2	0,900	3 010,00	2 709,00	0,622

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 574,69 0,000

6	961055111	Bourání základů z betonu včetně uložení suti - snížení úrovně pro předládění	m3	0,300	8 690,00	2 607,00	0,000
7	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel bílých	m3	1,173	2 530,00	2 967,69	0,000

767 Konstrukce zámečnické 2 700,00 0,000

8	767001001	demontáž oplocení výšky 1,25 m	bm	6,000	450,00	2 700,00	0,000
---	-----------	--------------------------------	----	-------	--------	----------	-------

PSV Úprava uličního oplocení 14 575,43 1,968

31 Zdi pozemních staveb 10 623,42 1,968

9	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm - sloupek plotový	m3	0,476	5 860,00	2 789,36	0,791
10	348273661	Sloupová hlavice 500x500 mm - D+M	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	0,033
11	348273661.	Ukončující hlavice nad energopilířem 1800x500 mm - D+M	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	0,033
12	348278005	Ploty z cihel a tvárnic nepálených vápenopískových zídky na maltu cementovou včetně spárování z cihel plných , tloušťka zdiva 300 mm	m2	1,606	3 010,00	4 834,06	1,111

91 Bourání 802,01 0,000

13	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel bílých	m3	0,317	2 530,00	802,01	0,000
----	-----------	---	----	-------	----------	--------	-------

767. Konstrukce zámečnické 3 150,00 0,000




14	767001001	demontáž oplocení výšky 1,25 m	bm	2,000	450,00	900,00	0,000
15	767001004	stavební připravenost pro ČEZ	hod	5,000	450,00	2 250,00	0,000

Celkem 41 928,32 2,661

Technický list změny (TLZ 13)

TLZ č./verze:	13/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 5. 10. 2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	186/OVZ/PV/2022
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.
Objekt:	
Název změny:	branka k venkovnímu schodišti
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Na základě požadavku Objednatele a z důvodu bezpečnosti budoucího provozu objektu bylo nutné nainstalovat zamykatelnou branku na schodiště vedoucí na pochozí část střechy Stavby, čímž dojde k zamezení neoprávněného vstupu návštěvníků a veřejnosti, kteří se v areálu Botanické zahrady pohybují. V rámci PD s tímto bezpečnostním řešením nebylo počítáno. Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).	
Popis změny:	
Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla vícepráce ve výši 5 175,00 Kč. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržáním původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.	
Přílohy:	
Příloha č. 1 – Změnový list č. 13 – branka k venkovnímu schodišti	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	5 175,00 Kč
	Celkem:	5 175,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	 Univerzita Palackého v Olomouci – PřF	12.10. 2023		
Za TDI:				
Za projektanta:	 Atelier Polách & Bravenec s.r.o.			
Za zhotovitele:	 E.PROXIMA, s.r.o.			

ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PřF UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.13 - branka k venkovnímu schodišti

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval: [REDACTED]


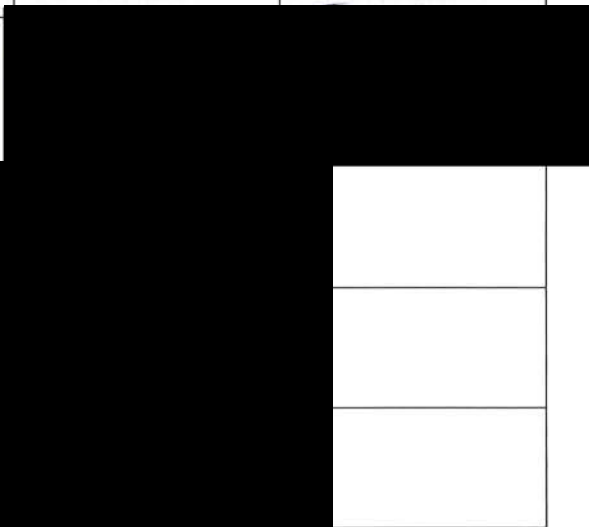
Datum: 5. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				5 175,00	0,000
767		Konstrukce zámečnické				5 175,00	0,000
1	767001005	dodávka a montáž branky k venkovnímu schodišti	kus	1,000	5 175,00	5 175,00	0,000
		Celkem				5 175,00	0,000

Technický list změny (TLZ 14)

TLZ č./verze:	14/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 5. 10. 2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	186/OVZ/PV/2022
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.
Objekt:	
Název změny:	kazetový podhled
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Po dohodě Objednatele s Generálním projektantem v rámci akustiky daných místností dojde ke změně materiálového složení podhledu v místnostech č. 102 a 103 Stavby tak, že původně navržený perforovaný dřevěný podhled bude nahrazen hladkým akustickým podhledem při zachování stejného designu. Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).	
Popis změny:	
Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla méněpráce ve výši -14 199,03 Kč. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržením původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.	
Přílohy:	
Příloha č. 1 – Změnový list č. 14 – kazetový podhled	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	221 699,03 Kč
	Přípočet:	207 500,00 Kč
	Celkem:	- 14 199,03 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	 Univerzita Palackého v Olomouci – PŘF	12. 10. 2023		
Za TDI:				
Za projektanta:	 Atelier Polách & Bravenec s.r.o.			
Za zhotovitele:	 E.PROXIMA, s.r.o.			

ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PřF UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.14 - kazetový podhled

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 5. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV	Práce a dodávky PSV	-14 199,03	0,000
------------	----------------------------	-------------------	--------------

763	Konstrukce suché výstavby	-14 199,03	0,000
------------	----------------------------------	-------------------	--------------





1	763200100	D+M podhled akustický dřevěný designový vč. nosného roštu bílého , 600x600 mm	m2	28,350	-1 880,00	-53 298,00	0,000
2	763200101	D+M podhled akustický dřevěný designový vč. nosného roštu bílého , 600x600 mm	m2	96,650	-1 742,38	-168 401,03	0,000
3	763200102	D+M podhled akustický minerální THERMATEx VARIOLine 600x600 mm včetně nosného roštu šedého	m2	125,000	1 660,00	207 500,00	0,000

Celkem	-14 199,03	0,000
---------------	-------------------	--------------

Technický list změny (TLZ 15)

TLZ č./verze:	15/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 5. 10. 2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	186/OVZ/PV/2022
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.
Objekt:	
Název změny:	neprováděné práce
Důvod změny a identifikace původce změny:	
V tomto změnovém listě jsou vyčísleny odečty prací a dodávek, které obsahovala nabídková cena rozpočtu Zhotovitele Stavby, ale po dohodě Objednatele s Generálním projektantem a TDI nebyly práce a dodávky provedeny. Jedná se o odpočet prací a dodávky tří kusů zemních mříží kolem stromů, odpočet dodávky a montáže oční sprchy a odpočet poplatku za připojení na kanalizační síť ve správě Moravské vodárenské a.s., který musí Objednatel (PŘF UPOL) jako vlastník objektu zaplatit při realizaci. Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).	
Popis změny:	
Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla méněpráce ve výši -41 545,92 Kč. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržáním původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.	
Přílohy:	
Příloha č. 1 – Změnový list č. 15 – neprováděné práce	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-41 545,92 Kč
	Přípočet:	0 Kč
	Celkem:	-41 545,92 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	 Univerzita Palackého v Olomouci – PŘF	12. 10. 2023		
Za TDI:				
Za projektanta:	 Atelier Polách & Bravenec s.r.o.			
Za zhotovitele:	 E.PROXIMA, s.r.o.			

ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PřF UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.15 - neprováděné práce

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 5. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV-odpočet mžíží kolem stromu				-29 062,02	0,000
1		Zemní práce				-348,08	0,000
1	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	-1,520	229,00	-348,08	0,000
2		Zakládání				-4 529,60	0,000
2	273313811	Kruhový základy z betonu tř. C 16/20	m3	-1,520	2 980,00	-4 529,60	0,000
5		Komunikace pozemní				-328,64	0,000
3	564841113	Podklad z kačírku tl. 80 mm	m3	-0,208	1 580,00	-328,64	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-23 855,70	0,000
4	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	-3,000	71,90	-215,70	0,000
5	939OST01	Litínová kruhová mříž 1500/500 mm včetně rámu	kus	-3,000	7 880,00	-23 640,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				-12 483,90	0,000
722		Zdravotechnika - vodovodní přípojka				-7 509,90	0,000
6	722100200	Moravská vodárenská - výstavba místních potrubí	mb	-15,000	500,66	-7 509,90	0,000
725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-4 974,00	0,000
7	725829505R00	Montáž kompletu nástěnné oční spršky	kus	-1,000	514,00	-514,00	0,000
8	SNLSLSN 21	Sprcha oční s jednou hlavicí, SLSN 21	ks	-1,000	4 460,00	-4 460,00	0,000
Celkem						-41 545,92	0,000

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PřF UPOL - II

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	Milník č. 5	Milník č.6	
Dodatek č.4	Dodatek č.4	185 741,72	69 171,07	116 570,65	
07	ZL č.7 - elektroinstalace - změny rozvaděč RE, RH, topné kabely..	88 344,10	88 344,10		
08	ZL č.8 - přípojka optokabelu	26 443,00		26 443,00	
09	ZL č.9 - odstranění pařezů	43 990,00		43 990,00	
10	ZL č.10 - vodoměrná šachta	13 168,00		13 168,00	
11	ZL č.11 - VO + přívod NN ke stávající budově	22 438,25		22 438,25	
12	ZL č.12 - úprava uličního oplocení a u vitrín	41 928,32		41 928,32	
13	ZL č.13 - branka k venkovnímu schodišti	5 175,00		5 175,00	
14	ZL č.14 - kazetový podhled	-14 199,03	-14 199,03		
15	ZL č.15 - neprováděné práce	-41 545,92	-4 974,00	-36 571,92	

Celkem

185741,72

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 4

Název stavby:
Číslo Smlouvy o dílo:
Cena díla dle SOD bez DPH:
Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:

VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.
186/OVZ/PV/2022
25 904 257,00 Kč
E.PROXIMA, s.r.o., Holická 1099/31, 772 00 Olomouc, IČ 25395602
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 61989592

ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZZVZ - 50 % původní hodnoty závazku
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl				
1	Skladby střechy a úprava atiky	Skladby střechy a úprava atiky	4	178 666,00	374 730,56	196 064,56	553 396,56	553 396,56	0,00	0,00
2	Výplně otvorů	Výplně otvorů	4	45 000,00	27 600,00	-17 400,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00
3	Změny ZTI	Změny ZTI	4	5 454,68	27 673,88	22 219,20	33 128,56	33 128,56	0,00	0,00
4	Kotvení stínění	Kotvení stínění	4	0,00	92 314,10	92 314,10	92 314,10	92 314,10	0,00	0,00
5	Doplnění hrubých rozvodů SLP	Doplnění hrubých rozvodů SLP	4	0,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00
6	Doplnění výztuže mazanin	Doplnění výztuže mazanin	4	0,00	14 456,65	14 456,65	14 456,65	14 456,65	0,00	0,00
7	Změny elektroinstalace	Změny elektroinstalace	4	50 932,10	131 676,00	80 743,90	182 608,10	182 608,10	0,00	0,00
8	Přípojka optokabelu	Přípojka optokabelu	4	0,00	26 443,00	26 443,00	26 443,00	26 443,00	0,00	0,00
9	Odstranění pařezů	Odstranění pařezů	4	0,00	43 990,00	43 990,00	43 990,00	43 990,00	0,00	0,00
10	Vodoměrná šachta	Vodoměrná šachta	4	13 500,00	26 668,00	13 168,00	40 168,00	40 168,00	0,00	0,00
11	VO+ přívod NN ke stávající budově	VO+ přívod NN ke stávající budově	4	0,00	22 485,25	22 485,25	22 485,25	22 485,25	0,00	0,00
12	Úprava uličního oplocení a u vitrín	Úprava uličního oplocení a u vitrín	4	0,00	41 928,32	41 928,32	41 928,32	41 928,32	0,00	0,00
13	Branka k venkovnímu schodišti	Branka k venkovnímu schodišti	4	0,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00
14	Kazetový podhled	Kazetový podhled	4	221 699,03	207 500,00	-14 199,03	429 199,03	429 199,03	0,00	0,00
15	Neprováděné práce	Neprováděné práce	4	41 545,92	0,00	-41 545,92	41 545,92	41 545,92	0,00	0,00
Změna celkem v Kč bez DPH				556 797,73	1 050 760,76	493 963,03	1 607 558,49	1 607 558,49	0,00	0,00

LIMITY podle § 222 ZZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%
	Limit dodatku	3 885 638,55 Kč	12 952 128,50 Kč
	Zůstatek limitu po dečtení předešlých změn	3 111 622,68 Kč	12 952 128,50 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	833 542,62 Kč	0,00 Kč
	Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	2 278 080,06 Kč	12 952 128,50 Kč

Původní cena díla bez DPH	25 904 257,00 Kč	Nová cena díla bez DPH	26 398 220,03 Kč
---------------------------	------------------	------------------------	------------------
